

Kvalitetssikring

Huscompagniet
Christian Hansen

H P Simonsens Alle 21
Byggepladsbesøg

21.03.2017



10:18 - 21.03.2017

GPS 55.3688,10.3541

Murbindere 27 cm. ud fra væg, ok



10:35 - 21.03.2017

GPS 55.3689,10.3541


Vederlagsblok til dragerspær Mont., ok

Kvalitetssikring

Huscompagniet
Christian Hansen

H P Simonsens Alle 21
Byggepladsbesøg

21.03.2017

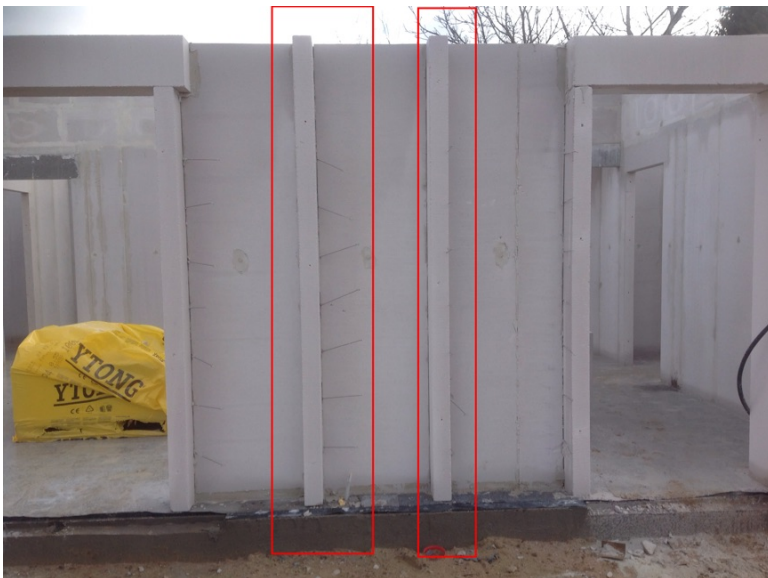

10:36 - 21.03.2017

GPS 55.3689,10.3540

2 ekstra falselementer iflg. Tegning. Ok



10:38 - 21.03.2017

GPS 55.3688,10.3542

Forankringer Mont., tømmer spænder dem fast. Ok
